RIFIUTI IN STOCCAGGIO

N	ATTIVITA'	AREA	DESCRIZIONE	elenco CER	m²	m³	t	CARATTERISTICHE
1	IPPC 1 trattamento RUI e RA	RUI e RA	Rifiuto Urbano e Rifiuti Assimilabili	020304 020501 020601 020701 020702 020704 030101 030105 030301 100101 100102 100103 100115 100117 190501 190502 190503 190599 191212 200141 200199 200301 200303 200306 200399	280	1300	780	Fossa sotto capannone in depressione
4	IPPC 1 trattamento RUI e RA	Spazzamento stradale e RA	Spazzamento strade e altri rifiuti assimilabili	200141 200303 200306	50	200	100	Sfuso su platea in cemento sotto capannone in depressione
5	Impianto selezione e produzione CDR 1	FS e RA	Frazione Secca e Rifiuti Assimilabili	020102 020104 020106 020304 020501 020601 020701 020702 020704 030101 030105 030199 030301 030308 030310 040108 040109 040221 040222 070213 070514 100101 100102 100103 100115 100117 120105 120117 150103 150106 150106 150199 150203 160119 160122 170201 170203 170904 190501 190502 190503 190599 191204 191207 191208 191210 191212 200101 200111 200138 200139 200138 200141 200199 200239 200301 200303 200307 200399	109	500	300	Fossa sotto capannone in depressione
7	produzione CDR 2	FS e RA	Frazione Secca e Rifiuti Assimilabili	020104 030199 040108 040109 040221 040222 070213 070514 120105 120117 150103 150106 150106 150199 150203 160119 160122 170201 170203 170904 191204 191207 191208 191210 191212 200110 200111 200138 200139 200203 200307	109	500	300	Sfuso su platea in cemento sotto capannone in depressione
8	produzione CDR	CDR	Combustibile da Rifiuti	191210	25	90	13	Sfuso su platea in cemento sotto tettoia
8 bis	produzione CDR 2	CDR	Combustibile da Rifiuti	191210	25	90	13	Sfuso su platea in cemento sotto tettoia
9	compostaggio RORS	RORS	Rifiuto Organico da Raccolta Separata	020102 020103 020106 020304 020501 020601 020701 020702 020704 030101 030105 030301 030308 030310 040221 100102 100103 150103 190606 191207 200108 200138 200201 200302	240	590	377	Sfuso su platea in cemento sotto capannone in depressione
10	compostaggio RORS	Verde	Verde, ramaglie e legno per compostaggio	020103 020704 030101 030105 030301 150103 200138 200201	400	1400	560	Sfuso su platea in cemento sotto tettoia
13	selezione imballaggi plastici e da RD multimateriale	SELEZIONE IN	Imballaggi da selezionare	070213 150102 150105 150106 160119 170203 191204 191212 200139 200301	400	1500	150	Imballato su platea in cemento
19	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RAEE R1	Frieddo e clima	200123* 200135* 200136	30	60	7	2 Cassoni su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
20	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RAEE R2	Altri grandi bianchi	200135* 200136	30	60	16	2 Cassoni su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
21	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RAEE R3	TV e Monitor	200135* 200136	15	30	6	Cassone con ceste su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
22	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RAEE R4	IT e Consumer elecronica, apparecchi di illuminazione (privati della sorgenti luminose) PED e altro	160215* 200135* 200136	15	30	6	Cassone con ceste su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
23	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RAEE R5	Sorgenti luminose	200121* 200135* 200136	8	8	0,48	4 Cassoni piccoli su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
24	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 1	Pile e batterie	160604 160605 200134 200303	15	30	30	Cassone su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
25	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 2	Farmaci scaduti	200131* 200132	15	30	6	Cassone su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
26	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 3	Fustini e latte vuoti	150110* 200127*	15	30	30	Cassone su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
27	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 4	Accumulatori al piombo	200133*	1,2	1,2	3	Cassone antiacido con apertura superiore su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
28	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 5	Olio minerale e sintetico (macchina)	200126*	1,2	0,8	0,72	Fusti da 200 litri con sistema antirabboccamento e bacino di contenimento su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
29	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 6	Olio minerale e sintetico (macchina)	200126*	1,2	1	0,9	Cisternetta con sistema antirabboccamento e bacino di contenimento su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
30	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 7	Oli e grassi commestibili	200125	1,2	1	0,9	Serbatoio verticale con bacino di contenimento su superficie pavimentata in asfalto
31	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 18	Inerti pericolosi	170204*	10	20	36	Box su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
32	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 19	Collettame e vari	080317* 080318 160112 160214 160215 200113* 200114* 200115* 200117* 200119* 200128* 200130	5	10	1	Scaffalatura (1x6,h3) con bacini di contenimento separati su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
33	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 8	Vetro	150107 160120 170202 200102	40	80	160	Box su superficie pavimentata in asfalto
34	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 9	Pneumatici fuori uso	160103 160122	80	160	16	Box su superficie pavimentata in asfalto
35	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 10	Ingombranti pericolosi	030104* 191206* 200131*	40	80	32	Box su superficie pavimentata in asfalto
36	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 11	Ingombranti	020104 030199 200138 200301 200307	80	240	96	Box su superficie pavimentata in asfalto
38	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 13	Metalli	020110 120101 120103 150104 160117 160118 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 180101 180201 191001 191202 200128 200140 200307	40	80	160	Box su superficie pavimentata in asfalto
39	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 14	Accessori in plastica	020104 070213 160119 170203 200307	40	80	24	Box su superficie pavimentata in asfalto
40	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 15	Tessili e abbigliamento	150109 150203 191208 200110 200111	40	80	24	Box su superficie pavimentata in asfalto
41	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 16	Inerti	170107 170504 170904 190599 200202 200203	40	120	216	Box su superficie pavimentata in asfalto
42	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 17	Edili	170101 170201 170302 170802 170904 200128 200301	40	120	192	Box su superficie pavimentata in asfalto
43	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 20	Carta e cartone	150101 200101	200	600	120	Box su superficie pavimentata in asfalto
44	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 22	Bombole	160504* 160505	6,25	12	8	Casetta prefabbricata

RIFIUTI A PROCESSO

N	ATTIVITA'	AREA	DESCRIZIONE	elenco CER	m2	m3	t	CARATTERISTICHE
2	IPPC 1 trattamento RUI e RA	Compost da rifiuto	Frazione Organica Stabilizzata compost da rifiuti	190503	50	200	100	Sfuso su platea in cemento sotto capannone in depressione
11	compostaggio RORS	Polpa	Polpa da pressoestrusione	020102 020103 020106 020304 020501 020601 020701 020702 020704 030101 030105 030301 030308 030310 040221 100102 100103 150103 190606 191207 200108 200138 200201 200302	164	700	560	Fossa sotto capannone in depressione
12	compostaggio RORS	Cippato	Verde, ramaglie e legno triturati	020103 020704 030101 030105 030301 150103 200138 200201	82	350	140	Fossa sotto capannone in depressione
16	selezione imballaggi plastici e da RD multimateriale	SELEZIONE OUT 3	Scarti di selezione grossolani (impianto CDR o frazione secca)	020104 070213 191204 200139	4	6	0,9	Cassone su platea in cemento sotto tettoia
18	selezione imballaggi plastici e da RD multimateriale	SELEZIONE OUT 5	Scarti si selezione fini (impianto CDR)	191210	4	6	0,9	Cassone su platea in cemento sotto tettoia
36	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 11	Ingombranti	020104 030199 200138 200301 200307	80	240	96	Box su superficie pavimentata in asfalto
40	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 15	Tessili e abbigliamento	150109 150203 191208 200110 200111	40	80	24	Box su superficie pavimentata in asfalto
42	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 17	Edili	170101 170201 170302 170802 170904 200128 200301	40	120	192	Box su superficie pavimentata in asfalto
43	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 20	Carta e cartone	150101 200101	200	600	120	Box su superficie pavimentata in asfalto sotto tettoia
46	IPPC 1 trattamento RUI e RA	Ferro	Ferro da deferrizzatore	191001 191202	10	10	30	Cassone su platea in cemento sotto capannone in depressione
46 bis	produzione CDR 2	Ferro	Ferro da deferrizzatore	191001 191202	10	10	30	Cassone su platea in cemento sotto capannone in depressione
47	compostaggio RORS	Ferro	Ferro da deferrizzatore	191001 191202	5	5	15	Cassone su platea in cemento sotto capannone in depressione
48	compostaggio RORS	FS RORS	Frazione secca da pressoestrusione Rifiuti Organico da Raccolta Separata	191210	15	30	10	Cassone su platea in cemento sotto capannone in depressione
53		PPD	Acqua di prima pioggia		30	65	62	Vasca interrata

RIFIUTI PRODOTTI CON LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITO TEMPORANEO

N	ATTIVITA'	AREA	DESCRIZIONE	elenco CER	m²	m³	t	CARATTERISTICHE
2	IPPC 1 trattamento RUI e RA	Compost da rifiuto	Frazione Organica Stabilizzata compost da rifiuti	190503	50	200	100	Sfuso su platea in cemento sotto capannone in depressione
3	IPPC 1 trattamento RUI e RA	Sovvallo	Sovvallo dalla vagliatura del compost da rifiuti	190501 191212	50	200	100	Sfuso su platea in cemento sotto capannone in depressione
5	produzione CDR	FS OUT 1	Frazione Secca derivate da impianto di trattamento	191210	25	90	13	Sfuso su platea in cemento sotto tettoia
5 bis	produzione CDR	FS OUT 2	Frazione Secca derivate da impianto di trattamento	191210	25	90	13	Sfuso su platea in cemento sotto tettoia
14	selezione imballaggi plastici e da RD multimateriale	SELEZIONE OUT 1	imballaggi in plastica in balle 80x90 (PE - PET - LDPE altri polimeri)	150102 191204	90	260	130	Box su platea in cemento sotto tettoia
15	selezione imballaggi plastici e da RD multimateriale	SELEZIONE OUT 2	Alluminio sfuso	150104 191002 191203 200140	4	6	9	Cassone su platea in cemento sotto tettoia
17	selezione imballaggi plastici e da RD multimateriale	SELEZIONE OUT 4	Ferro sfuso	150104 191001 191202 200140	4	6	18	Cassone su platea in cemento sotto tettoia
37	stoccaggio rifiuti da RD e RA	RD 12	Ferro da deferrizzatore	191001 191202	40	80	230	Box su platea in cemento

RIFIUTI PRODOTTI IN DEPOSITO TEMPORANEO

N	AREA	m²	m³	t	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE	Elenco CER
55	OFF7	0,05	0,1	0,05	Locale infiammabili	Olio da manutenzione mezzi e impianti	130205 200126
56	OFF8	0,05	0,1	0,03	Locale infiammabili	Filtri olio	160107
57	OFF9	1	0,5	0,5	Officina	Neon da manutenzione	200121
60	PPA	15	20	20	Vasca interrata	Acqua di prima pioggia	190702* 190703
61	PPB	9	15	15	Vasca interrata	Acqua di prima pioggia	190702* 190703
62	PPC	30	60	60	Vasca interrata	Acqua di prima pioggia	190702* 190703
63	PPD	30	65	62	Vasca interrata	Acqua di prima pioggia	190702* 190703
64	VP1	30	90	90	Vasca interrata	Percolato compostaggio	190702* 190703
65	VP2	70	200	200	Vasca interrata	Percolato impianti	190702* 190703
66	VP3	100	300	300	Vasca interrata	Percolato RD	190702* 190703

MATERIE PRIME

N	AREA	m²	m³	t	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE
49	OFF1	1	3,3	3	Locale infiammabili	Olio per manutenzione mezzi e impianti
50	OFF2	0,5	0,6	0,5	Locale infiammabili	Grasso per manutenzione mezzi e impianti
51	OFF3	1	0,5	0,5	Officina	Neon per manutenzione
52	OFF4	0,09	0,09	0,09	Officina	Deodorizzante
53	OFF5	0,5	0,2	0,2	Officina	Saponia
54	OFF6	0,05	0,3	0,3	Area bombole	Bombole acetilene
58	SER1	10	20	16	Serbatoio	Gasolio per autotrazione
59	SER2	10	20	16	Serbatoio	Kerosene per riscaldamento

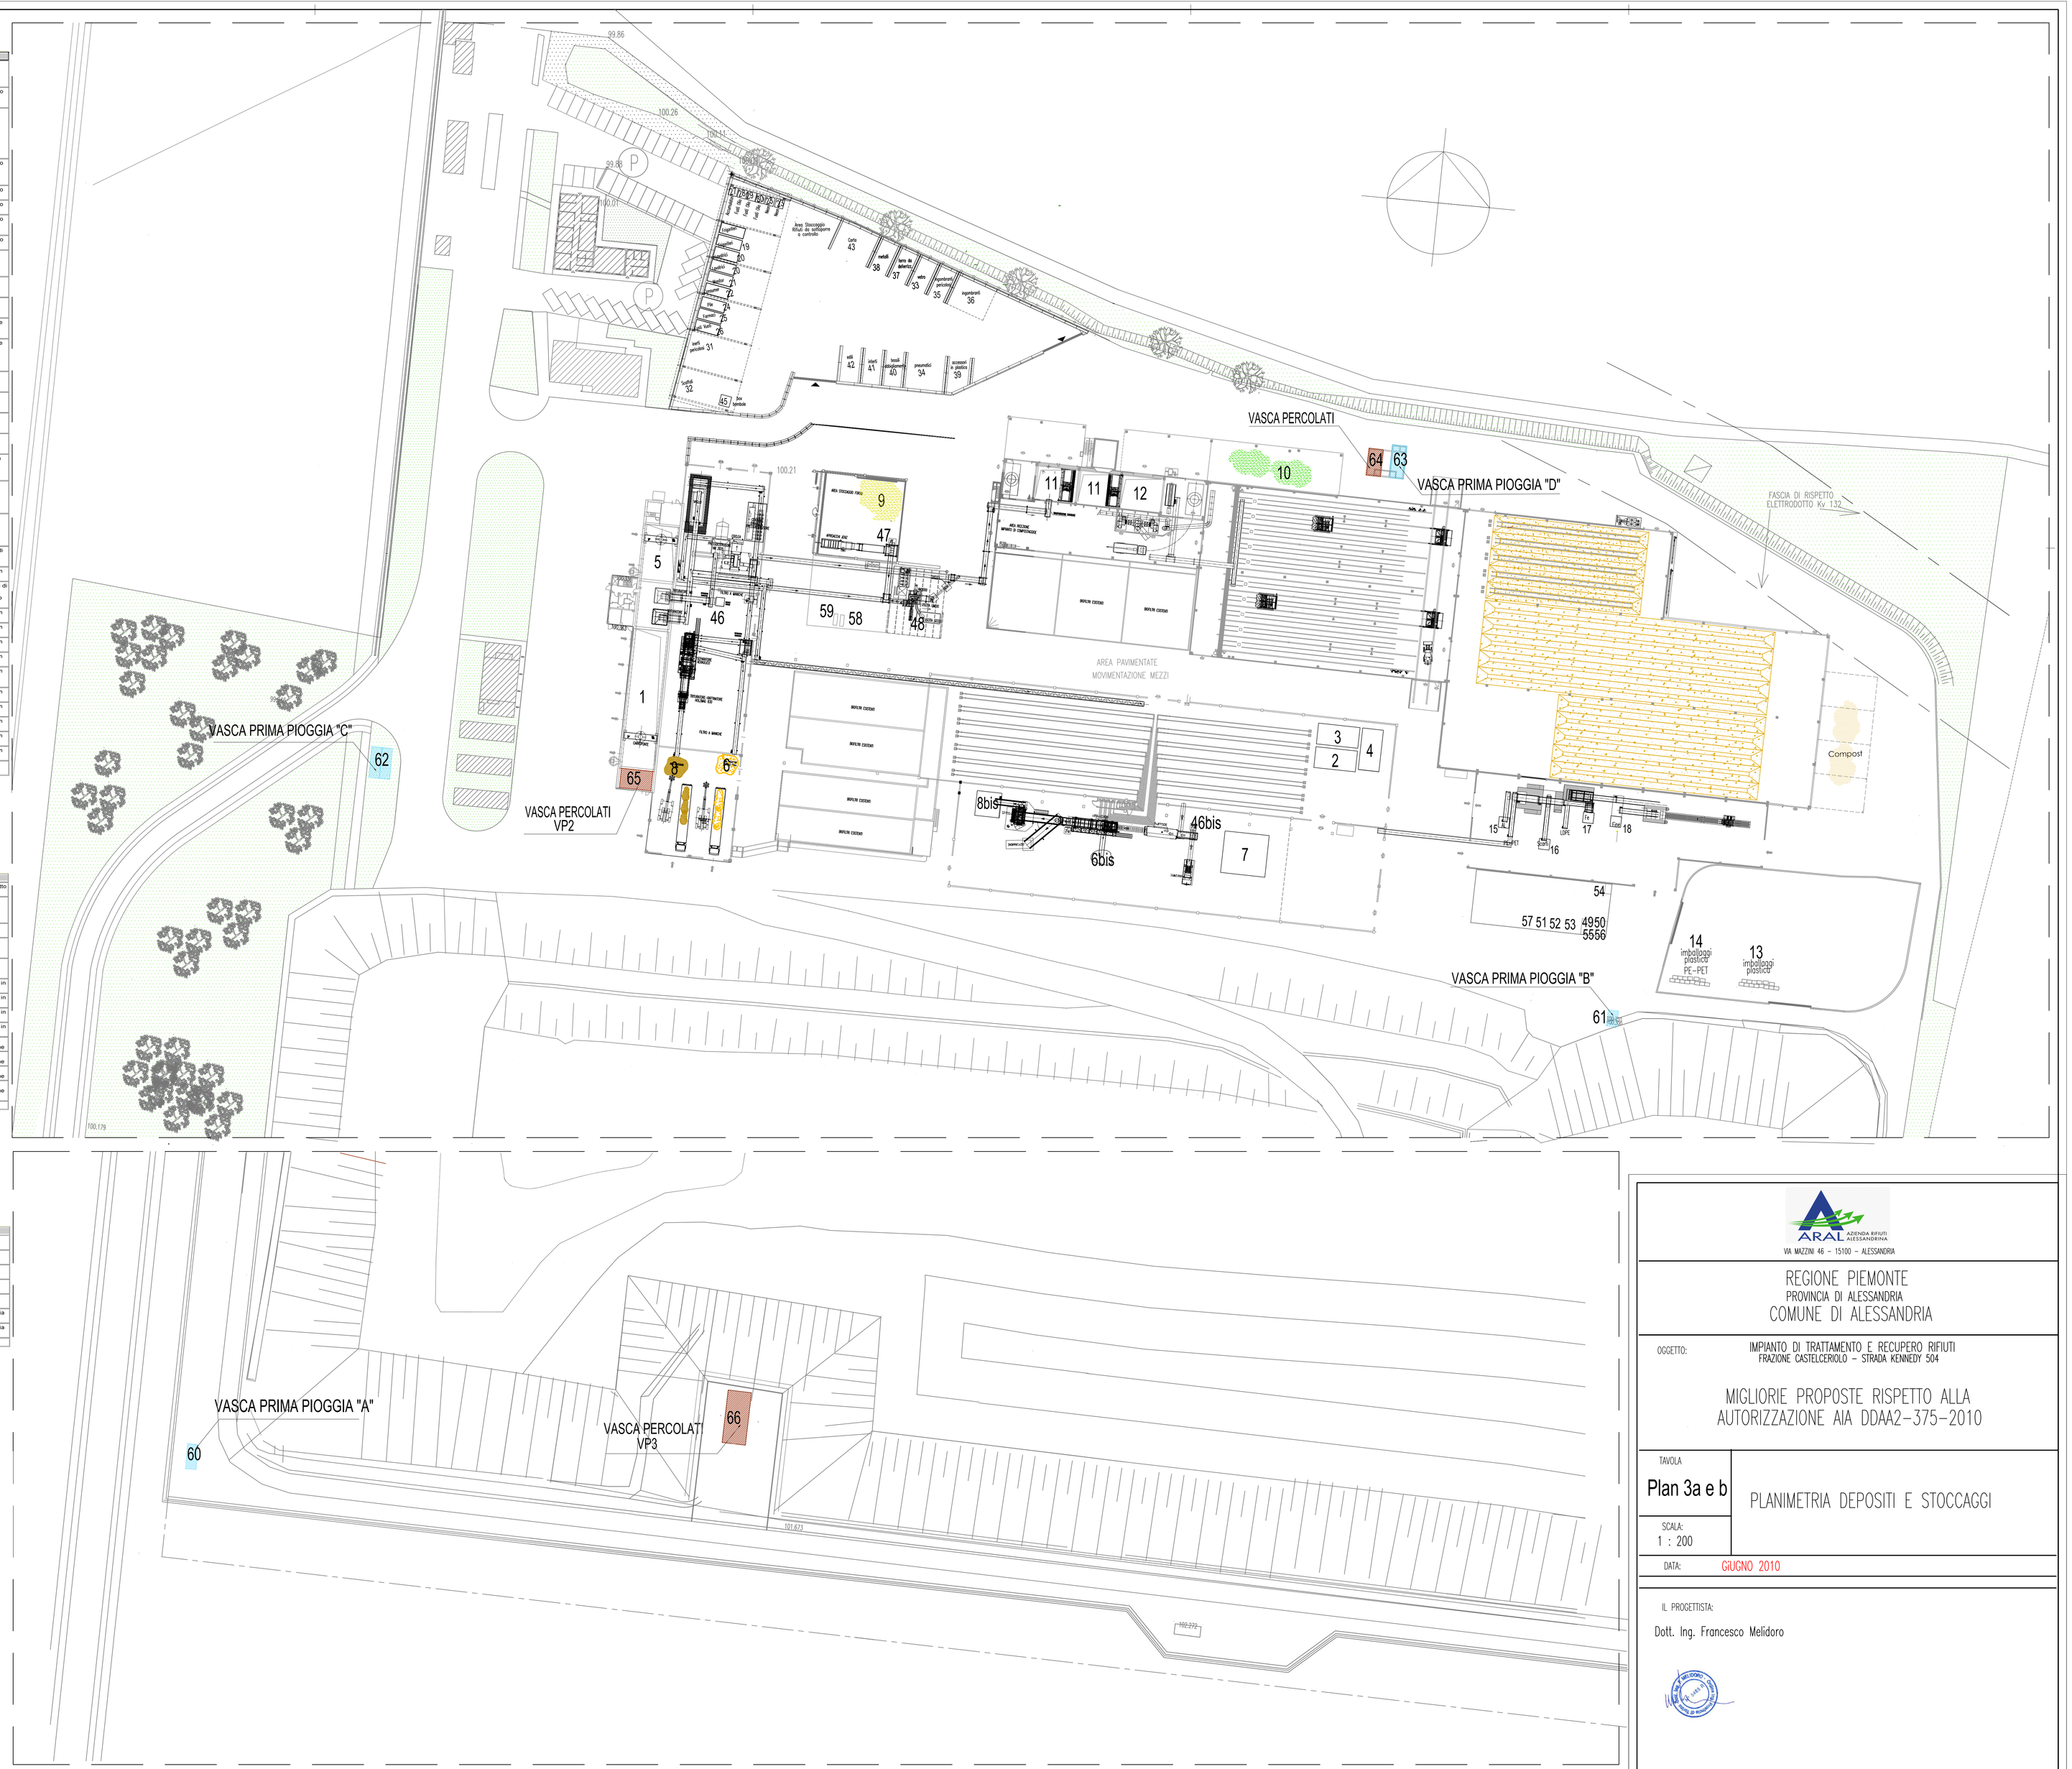

ARAL AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA
VIA MAZZINI 46 – 15100 – ALESSANDRIA

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI ALESSANDRIA

OGGETTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI
FRAZIONE CASTELCERRIOLO – STRADA KENNEDY 504

MIGLIORIE PROPOSTE RISPETTO ALLA AUTORIZZAZIONE AIA DDAA2-375-2010

TAVOLA: Plan 3a e b

PLANIMETRIA DEPOSITI E STOCCAGGI

SCALA: 1 : 200

DATA: GIUGNO 2010

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Francesco Melidoro
